
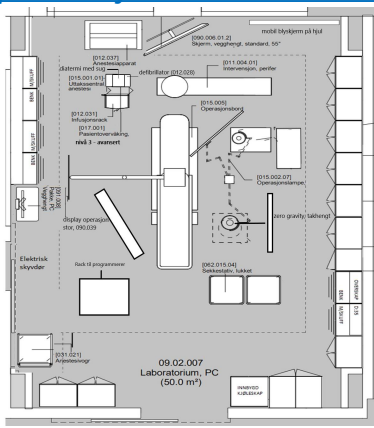


| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Byggherre Felles U PCI/Pacemaker | |  |
| Dato/tid: 30.11.2023 12:30 | Lokasjon: Forskningsparken | |
| Ansvarlig Ingeborg Sand | | Klassifiseringskode |
| Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet | | Neste møte i serien |

Agenda

| | |
|--|---|
| 001 <input type="checkbox"/> | Agenda 1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møtet v/fagkoordinator 2. Hensikt og mål med møtet v/fagkoordinator 3. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder OUS 4. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO 5. Veien videre 6. Eventuelt WFL-49327: Møte 02 pulje 1 - PCI/pacemaker |
| 002 <input type="checkbox"/> | Deltakere Vedlagt deltakerliste. Deltagerliste Gruppe U PCI Pacemaker.pdf |
| 003 <input type="checkbox"/> | Tilbakemelding fra gruppen på utstyrslister Tilbakemeldingene ble gjennomgått og diskutert i møtet. Alt som er referert i arbeidsloggen kommer i tillegg til tilbakemeldingene fra gruppen i innsendte excellister, vedlagt dette agendapunktet. operasjon utstyr.xlsx sporsmal-og-utstyrsliste-gruppe-u---pci-pacemaker-nye-aker.xlsx Kopi av utstyrsliste aker tilbakemelding PCI 27112023.xlsx  <p>01 des 2023 Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023 RUT oppdaterer utstyrslister i dRofus forbindelse med tilbakemelding fra medvirkningsgruppen.</p> <p>01 des 2023 Sigrud Rossebø Hansen frist: 29 des 2023</p> |

004



Gnerelt

Vask på alle manøverrom er ivaretatt. De er plassert under overskap som gjør det vanskelig å se på 2D skissen.

Gruppen ønsker at akuttnisje kan erstattes med renholdsrom og at renholdsrommet kan erstattes med lite samtalerom. ARK opplyser om at arealet ser for smalt ut for samtalerom, men kan benyttes som nisje for blyfrakker til besøkende eller sengeoppstilling som er et alternativt ønske fra gruppen.



04 des 2023 **Sigrid Rossebø Hansen frist: 29 des 2023**

ARK oppdaterer modell etter innspill i aksjon ang. akuttralle gitt til Nye OUS

30 nov 2023 **Trine Braaten frist: 29 des 2023**

Gruppen mener at akuttralle kan utgå fra området da utstyret er ivaretatt på lab. Nye OUS avklarer med akuttklinikken om denne kan utgå.

07 des 2023

Akuttrallen kan utgå (Trine Braaten)

04 des 2023 **Sigrid Rossebø Hansen frist: 29 des 2023**

Dør i korridor mot ERCP (venstre side) bør flyttes slik at alle rom som tilhører funksjonen ligger innenfor grønn sone. ARK oppdaterer modell.

06 des 2023

Dør er flyttet.

(Sigrid Rossebø Hansen)

005



09.02.007 Laboratorium, PCI

Det er behov for gjennomlysning, monoplan. Gruppen er svært usikker på om det vil bli tak- eller vegghengt løsning. Dette vil ikke bli bestemt før anskaffelse er gjennomført. Bygget bør kunne ivareta begge løsninger.

Operatør jobber på pasientens høyre arm.

Pasienten fraktes inn på motsatt side, dør til rom bør flyttes slik at inntransport av pasient blir mest mulig optimal.

Legen står mot manøverrom, ønsker å skråstille lab noe, hodeenden til pasient skal roteres vekk fra manøverrom.

Koblingsboks for strøm og nettverksuttak på gulv under bordsokkelen er en fordel for senere tilkobling av tredjepartleverandører. Gruppen ønsker at det legges tilrette for trekkerør fra rom til teknisk rom for framtidig innstallasjon og ny teknologi.

OUS oversender bilde av dagens løsninge med koblingsboks under sokkel på lab, se egen aksjon.

0,5 meter veggskinne for kolber, plasseres i rommet hvor det er ledig veggplass.

Gruppen ønsker automatisk døråpner med fot.

Ønsker to blyfrakkstativ på lab, ikke på manøverrom.



30 nov 2023 Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023

Oppdater utstyrsliste etter tilbakemelding fra medvirkningsgruppen

30 nov 2023 Sigrud Rossebø Hansen frist: 29 des 2023

Oppdatere utstyrsliste og romskisser etter tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen

01 des 2023 Sigrud Rossebø Hansen frist: 15 des 2023

Prosjekteringsgruppen beskriver hvordan fremtidig utskiftning av utstyr blir ivaretatt i bygget. Eks. hvordan ivaretar man utskiftning om det kjerneborres for operasjonsbord. Prosjekteringsgruppen beskriver løsning for trekkerør etc.

04 des 2023 Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023

Oppdater utstyrsliste med veggskinne for kolber.

04 des 2023 Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023

Oppdater utstyrsliste iht tilbakemelding fra medvirkningsgruppen.

30 nov 2023 Trine Braaten frist: 07 des 2023

OUS oversender løsning fra eksisterende lab på koblingsboks plassert ved bordsokkel for tilkobling av utstyr.

07 des 2023

| | |
|---|--|
| | <p><i>Bilde er oversendt fra gruppeleder til utstyrskordinator HSØ (Trine Braaten)</i></p> <p><u>30 nov 2023</u> Trine Braaten frist: 07 des 2023 OUS oversender ønsket plassering av utstyr som arbeidsbenk, PC og medisinskap på hver enkelt PCI lab. 07 des 2023 <i>Se vedlagt skisse oversendt fra PCI miljøet (Trine Braaten)</i></p> |
| <p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>09.02.024 Laboratorium, pacemaker</p> <p><u>04 des 2023</u> Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023 Oppdater utstyrslister ihht tilbakemelding fra medvirkningsmøte.</p> <p><u>30 nov 2023</u> Trine Braaten frist: 07 des 2023 Hvilken type ultralydapparat ønsker OUS å plassere på lab? Hvilke prosedyrer skal apparatet benyttes til? 07 des 2023 <i>Enkel model, det bør være tilgjengelig ekko apparat for punksjonsveiledning og enkel/akutt diagnostikk (Trine Braaten)</i></p> |
| <p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>09.02.026 Manøverrom, pacemake</p> <p>Slaveskjem bør vende inn mot manøverromet og henge over vindu til lab.</p> <p><u>04 des 2023</u> Sigrid Rossebø Hansen frist: 29 des 2023 ARK oppdaterer plassering i rom ihht tilbakemelding fra medvirkningsgruppen.</p> |
| <p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>09.02.035 og 044 Lager, utstyr</p> <p>Ønsker å endre vei på kassebakke slik at de ikke blir så dype. ARK ser på utforming av rommet, mest mulig lagring.</p> <p>MTU legges inn på lager, utstyr 09.02.035. Det må tilrettelegges for strøm og nettverkspunkt i rommet.</p> |
| <p>009</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>09.02.038, 046 og 047 Kontor og arbeidsrom</p> <p>Medvirkningsgruppen ga følgende tilbakemelding i møte på arbeidsrom: Plassene i arbeidsrommet bør adskilles med skjermvegger. Det er ønskelig å se på mulighet for stillerom for telefonsamtaler i rommet. Det er ønskelig med hyller over arbeidsplassene. Det er ønskelig så mange arbeidsplasser som mulig. Det er ønskelig med 2 skjermer 55" for demonstrasjon, bør være plassert midt på rommet på en side. Tar ut tavlen og erstatter den med en av skjermene.</p> <p><u>04 des 2023</u> Bjørn Tore Mølsæter frist: 29 des 2023 Oppdater utstyrsliste ihht tilbakemelding fra medvirkningsgruppen.</p> <p><u>04 des 2023</u> Sigrid Rossebø Hansen frist: 29 des 2023 ARK oppdaterer utstyrslisten og modell ihht tilbakemelding fra medvirkningsgruppen.</p> |
| <p>010</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Eventuelt</p> <p>Gruppen ønsker at det tilrettelegges for kontor med glass mot korridor ved trappegang. Området er beholdt av prosjektet for å gi lys inn til korridor og for å skape</p> |

soner i fellesarealer.

30 nov 2023 **Trine Braaten frist: 07 des 2023**

Nye OUS avklarer om det er ønskelig at det prioriteres inn et arbeidsrom/kontor med glass mot korridor i område ved trapp.

07 des 2023

Arealet skal stå åpent og ikke etableres med arbeidsrom. (Trine Braaten)

011

Veien videre

Det ble avklart i medvinningsmøte at medvinningsmøte avsluttes for gruppen. Det avholdes særmøter ved behov for ytterligere funksjonsavkalringer.

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Ingeborg Sand, HELSE SØR-ØST RHF
- Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF
- Trine Braaten,
- Elisabeth Sogstad Grannes, HELSE SØR-ØST RHF

- Morten Tønnessen, SYKEHUSBYGG HF
- Sigrid Rossebø Hansen,
- Bjørn Tore Mølsæter,

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

- ,

Gruppe U - PCI/Pacemaker

| Klinikk | Navn | Rolle | Tilstede |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| HLK | Nils E. Wilhelmsen | Gruppeleder NSA | x |
| HLK | Hilde Aarseth | Fagperson NSA | x |
| HLK | Anders Opdahl | Fagperson NSA | |
| HLK | Stian Balnagown Ross | Fagperson NRH | x |
| MED | Stina Cecilie Storgaard Hjortsjö | Fagperson NSA | |
| MED | Lill Torjesen | Fagperson NSA | |
| MED | Paul Vanberg | Fagperson NSA | |
| AKU | Henrik Lund | Fagperson NSA | x |
| TIK | Matin Abdolghafari | Fagperson NSA | |
| MED | Veronica Freire de Mendonca | Verneombud | |
| Norsk Radiografforbund | Trond Erling Neergaard Ovesen | Tillitsvalgt | x |
| DNLF | Hysen Muriqi | Tillitsvalgt | |
| NYE OUS | Trine Braaten | Fagkoordinator NSA | x |
| HSØ PO | Morten Tønnesen | Referent NSA | |
| HSØ PO | Ingeborg Sand | Fasilitator NSA | x |
| PG | Sigrid Rossebø Hansen | Arkitekt NSA | x |
| PG | Kristina Rogers | Arkitekt NSA | x |
| PG | Bjørn Tore Mjølseter | Rådgiver utstyr NSA | x |
| PG | Christian Ullriksen | RIV NSA | x |

09.02.007 Laboratorium, PCI

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Er utstyrlisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? | RUT | | |
| 2 | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer" | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | |
| 031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT | |
| 015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT | |
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT | |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| 090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT | |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |

09.02.024 Laboratorium, pacemaker

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | | | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer" |
| 2 | | | Er utstyrlisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | |
| 031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | |
| 015.010 | Arm, leddet for takinnfesting | 2 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 090.039 | Display, operasjon, stor | 2 | IKT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT | |
| 015.002.02 | Operasjonslampe, med satellitt | 1 | RUT | |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| 091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |
| | Zero gravity (takhengt) | 1 | | |
| | Krakker med hjul vaskbare | 3 | | |
| | Liten metall trapp | 1 | | |
| | Oppheng desinfeksjonssprit | 4 | | |
| | Luftmanometer | 2 | | |
| | Rack til programmere | 1 | | |
| | Diatermi med aktivt sug | 1 | | |
| | Utlalyd apparat | 1 | | |
| | Mobil blyskjerm | 1 | | |
| | Medisinskapp med kjøleskap | 1 | | |
| | Oppbevaring kontrast | 1 | | |
| | Oppkobling for datalagring | 1 | | |
| | Alarm system / knapper | 1 | | |
| | Telefon | 2 | | |
| | White board | 1 | | |

09.02.035 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|--|--------|--------|---|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | | ARK |
| GFA.005.02 | Kjøleskap, medisin, ca. 150 cm | 1 | | RUT |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK |

09.02.044 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|--|--------|--------|---|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | | ARK |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK |

09.02.026 Manøverrom, 2 plasser

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | ARK | | |
| 2 | ARK | | |
| 3 | ARK | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | | 2 IARK | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | | 1 HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | | 4 IARK | |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | | 1 RIV | |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | | 1 RUT | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | | 2 IARK | |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | | 1 IKT | |
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | | 1 IKT | |
| FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | | 1 ARK | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |

09.02.027 Manøverrom, 3 plasser

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

1 Gruppen bes vurdere størrelse på arbeidsbord i forhold til antall skjermer. ARK
1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere

2 tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer.
Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal ARK

3 oppbevares der?

4 Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på ARK
manøverromn? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere
tilbakemelding.

Ber om så store skrivebord som mulig

Sko, blyfrakker munnbind, hetter, desinfeksjonssprit,

Nei

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|--|--------|--------|---|
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | | IKT |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | | RUT |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | | IKT |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | | RUT |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | | HF |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | | ARK |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | | IARK |
| GHA.001.03 | Skap med glassdør, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | | IARK |
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 3 | | IARK |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, (operasjonsvask med sensor) | 1 | | RIV |
| | Knaggrekke | 1 | | |
| | Skostativ | 1 | | |
| | Speil | 1 | | |
| | Små låsbare skap | 8 | | |
| | Oppheng til desinfeksjonssprit og såpe | 4 | | |
| | Tørkepapir holder | 1 | | |

09.02.008 Lager, rent

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | | IKT |
| 061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | | RUT |
| FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | | ARK |
| FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | | ARK |
| FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | | ARK |
| FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | | ARK |
| FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | | ARK |

09.02.008 Lager, rent

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet? | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | | 6 IARK | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | | 1 HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | | 1 IARK | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | | 6 IARK | |
| 091.014 | Pakke, PC digital samhandling | | 1 RIKT | |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | | 6 IKT | |
| 090.006 | Skjerm, vegghengt | | 1 IKT | |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | | 8 IARK | |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | | 2 IARK | |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | | 1 ARK | |

09.02.007 Laboratorium, PCI

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? | RUT | | |
| 2 | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer" | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | |
| 031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT | |
| 015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT | |
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT | |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| 090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT | |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |

09.02.024 Laboratorium, pacemaker

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | | | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer" |
| 2 | | | Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | |
| 031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | |
| 015.010 | Arm, leddet for takinnfesting | 2 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 090.039 | Display, operasjon, stor | 2 | IKT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT | |
| 015.002.02 | Operasjonslampe, med satellitt | 1 | RUT | |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| 091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |

09.02.035 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|--|--------|--------|---|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | | ARK |
| GFA.005.02 | Kjøleskap, medisin, ca. 150 cm | 1 | | RUT |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK |

09.02.044 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|--|--------|--------|---|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | | ARK |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK |

09.02.026 Manøverrom, 2 plasser

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | ARK | | |
| 2 | ARK | | |
| 3 | ARK | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | | 2 IARK | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | | 1 HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | | 4 IARK | |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | | 1 RIV | |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | | 1 RUT | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | | 2 IARK | |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | | 1 IKT | |
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | | 1 IKT | |
| FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | | 1 ARK | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |

09.02.027 Manøverrom, 3 plasser

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

1 Gruppen bes vurdere størrelse på arbeidsbord i forhold til antall skjermer. ARK
1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere

2 tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer.
Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal ARK

3 oppbevares der?

4 Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på ARK
manøverromn? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere
tilbakemelding.

Ber om så store skrivebord som mulig

Sko, blyfrakker munnbind, hetter, desinfeksjonssprit,

Nei

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|--|--------|--------|---|
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | | IKT |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | | RUT |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | | IKT |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | | RUT |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | | HF |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | | ARK |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | | IARK |
| GHA.001.03 | Skap med glassdør, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | | IARK |
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 3 | | IARK |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, (operasjonsvask med sensor) | 1 | | RIV |
| | Knaggrekke | 1 | | |
| | Skostativ | 1 | | |
| | Speil | 1 | | |
| | Små låsbare skap | 8 | | |
| | Oppheng til desinfeksjonssprit og såpe | 4 | | |
| | Tørkepapir holder | 1 | | |

09.02.008 Lager, rent


| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | | IKT |
| 061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | | RUT |
| FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | | ARK |
| FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | | ARK |
| FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | | ARK |
| FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | | ARK |
| FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | | ARK |

09.02.008 Lager, rent

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet? | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | | 6 IARK | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | | 1 HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | | 1 IARK | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | | 6 IARK | |
| 091.014 | Pakke, PC digital samhandling | | 1 RIKT | |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | | 6 IKT | |
| 090.006 | Skjerm, vegghengt | | 1 IKT | |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | | 8 IARK | |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | | 2 IARK | |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | | 1 ARK | |

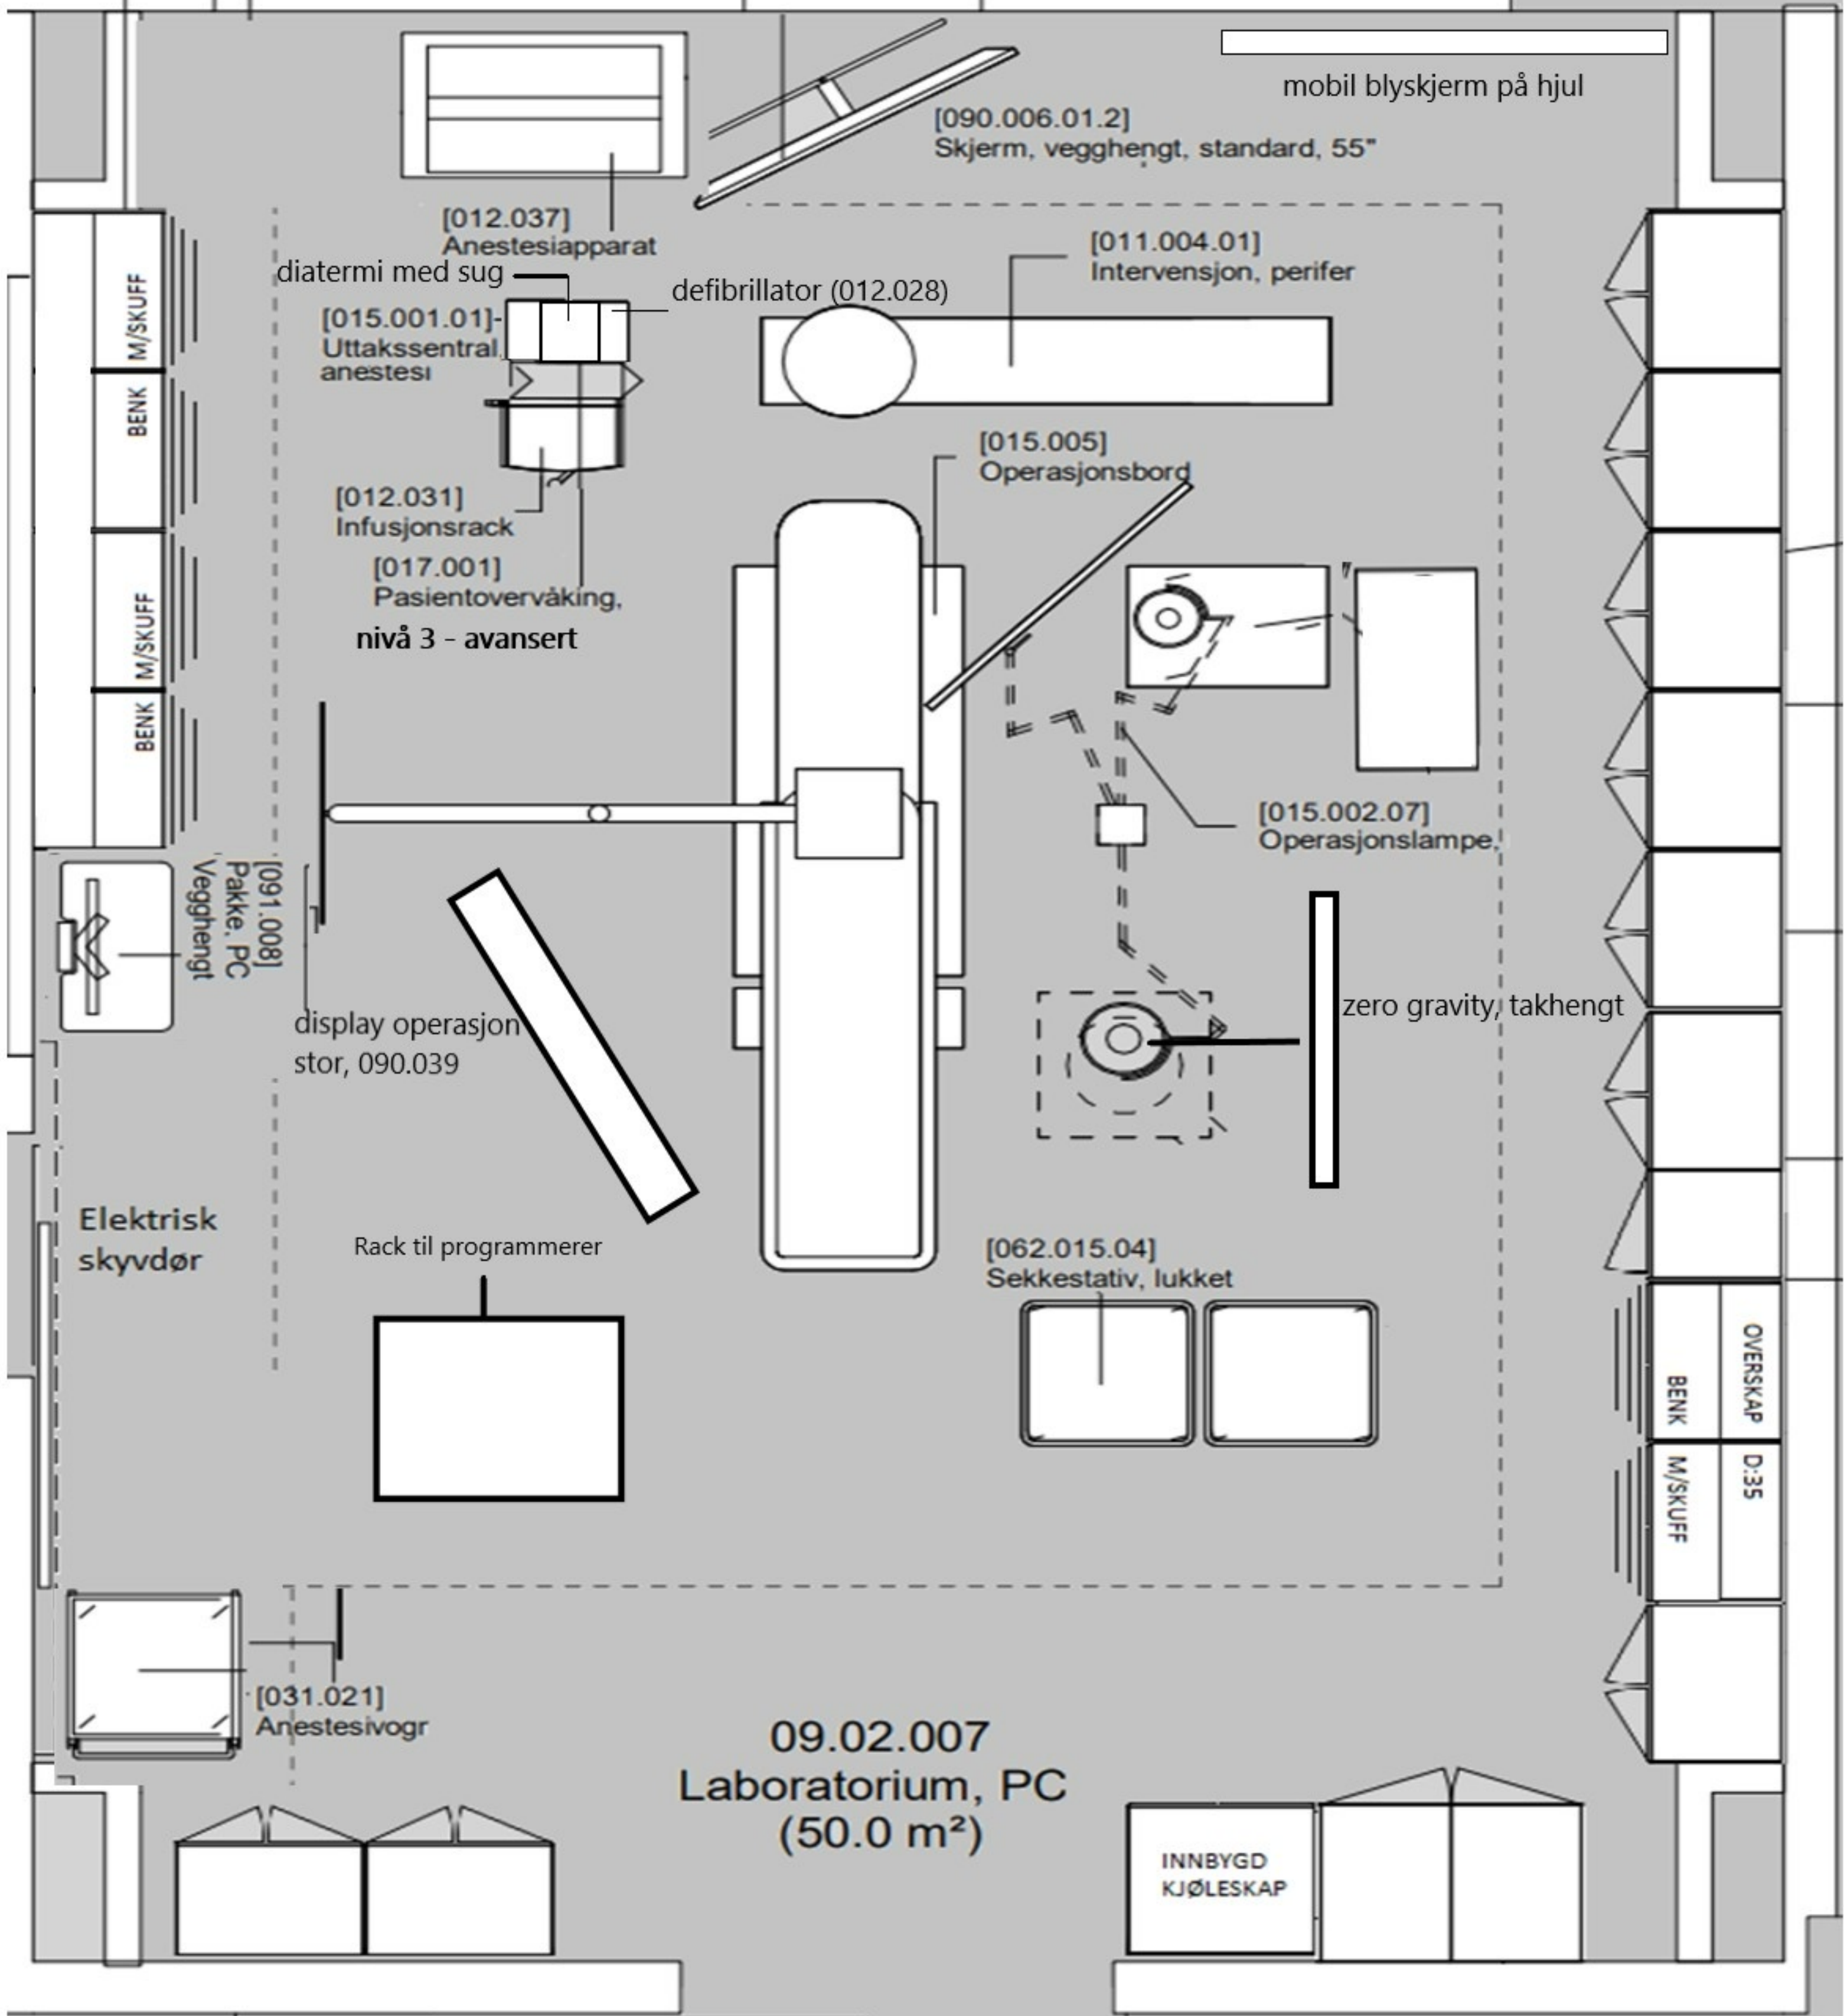


Kopi av utstysrliste aker tilbakemelding PCI 27112023.xlsx (003 - Tilbakemelding fra gruppen på utstysrsteder)

09.02.007 Laboratorium, PCI

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Er utstysrlisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? | RUT | | Nei, se kommentarer |
| 2 Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer" | | | Er røntgendelen/armen av angiomasinen (hører sammen med operasjonbord) |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | Tegnes inn ved vindu |
| 031.021 | Anestesiivogn | 1 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hevet/senk | 1 | RUT | Må være større 60x140cm? |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | ? |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | 1 stk B:260 cm D:45cm. 1stk B:130 cm D:45 cm |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | Plasseres riktig - motsatt side |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | Trenger bare 1 eller 2 skap av denne typen |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | Til høyre for inngang fra gang |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | Ant? |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonbord | 1 | RUT | |
| 015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT | |
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT | PC m/Metavision, flyttes til hjørne ved benk mot sjalterom |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | Flytte til hodeende |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| 090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT | Frame in frame TV/Skjerm, mot yttervegg vindu |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | 4 stk mot sjalterom og 2 stk på skapvegg med benkeplate over. B:65 cm D:45cm |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | 3 eller 4 stk |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | Skuffer på alle underskap. B:65 cm D:45cm |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |
| Medisinsk kjøleskap innbyggingmodel | | 1 | | |
| Ultralyd for hjerte med proper/utstyr for pericardtapping og innstikk lyske/arm | | 1 | | |
| Mobil blyskjerm på hjul | | 1 | | |
| Høyskap Doble dører m/glass B=65 cm D=45cm | | 9 | | I stedet for høyskap med D=45cm og B=65cm |
| Overskap over alle benker og høyskap | | 18-20 | | 2 av de til venstre for inngang fra gang |
| Krakk i metall for pasienten til å stige opp på operasjonbordet | | 1 | | |
| Krakk med hjul til å sitte på u/rygg med hevet senk | | 2 | | Kan også brukes til å stå på ved komprimering |
| Veggskinne til O2 kolbe | | 1 | | |
| Automatisk kontrastsprøyte (Accicst?) | | 1 | | |
| Elektronisk skyddør fra sjalterom til lab | | | | |
| Tegne inn skjermen til angiolasen | | | | |
| Skråstille labene ca 10-15 grader? | | | | |

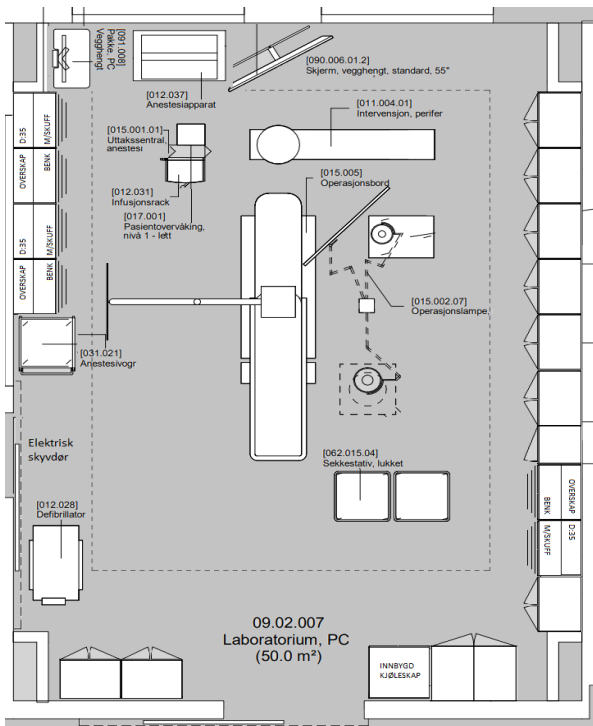

09.02.024 Laboratorium, pacemaker

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

1 Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer"

2 Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ?

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT | |
| 031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | |
| 015.010 | Arm, leddet for takinnfesting | 2 | RUT | |
| 061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK | |
| 037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT | |
| 012.028 | Defibrillator | 1 | RUT | |
| 090.039 | Display, operasjon, stor | 2 | IKT | |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT | |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK | |
| 012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT | |
| 012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT | |
| 012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT | |
| 011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT | |
| 015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT | |
| 015.002.02 | Operasjonslampe, med satellitt | 1 | RUT | |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | |
| FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK | |
| UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE | |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT | |
| 091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT | |
| FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | |
| 015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT | |

Kopi av utstyrsliste akter tilbakemelding PCI 27112023.xlsx (003 - Tilbakemelding fra gruppen på utstyrslister)

09.02.035 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | Div medisinsisk utstyr, f.eks aorta ballongpumpe, rotablator, shockwave og diamondback Og spesialvarer spesifikt for PCI virksomhet | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|--|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK Flytte til endevegg over sykeromskanal |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør med glass | 4 | | ARK |
| GFA.005.02 | Kjøleskap, medisinske, ca. 150 cm | 1 | | RUT Fjerne? |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK Fjerne? Inne på lab i stedet |

Trillbart skap med bakker/skuffer til spesialprosedyrer (ca d=500 b=650 h=200)

Høyskap d=450 b=650 h=2100, doble dører med glass


Varmeskap veggheng ca 10 liter

Hyllesystem fra gulv til tak, vegg til dør. Plassert til venstre for dør. Fra vegg mot vegg på høyskap

minus medisinsk kjøleskap? (På hver lab i stedet?)

1
2
1


Tegnes inn til hjørne ved døråpning
Mot vegg der hylle er tegnet inn
Tegnes inn til høyre for kjøleskap

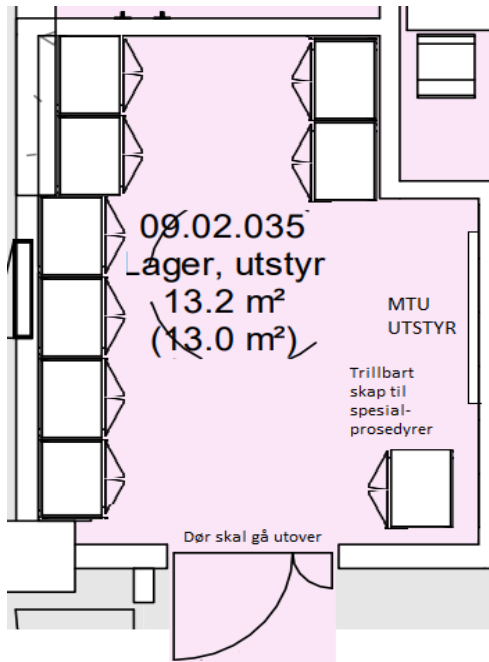

09.02.044 Lager, utstyr

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret. | | | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|--|--------|--------|---|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | | ARK Fjernes |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 9 | | ARK Skal være d=457 B=650 h=210 doble dører med vindu |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | | RIE Fjernes |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | | ARK Fjernes |
| | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | | |
| | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | | d=450 B=650 |
| | PC på vegg | 1 | | |

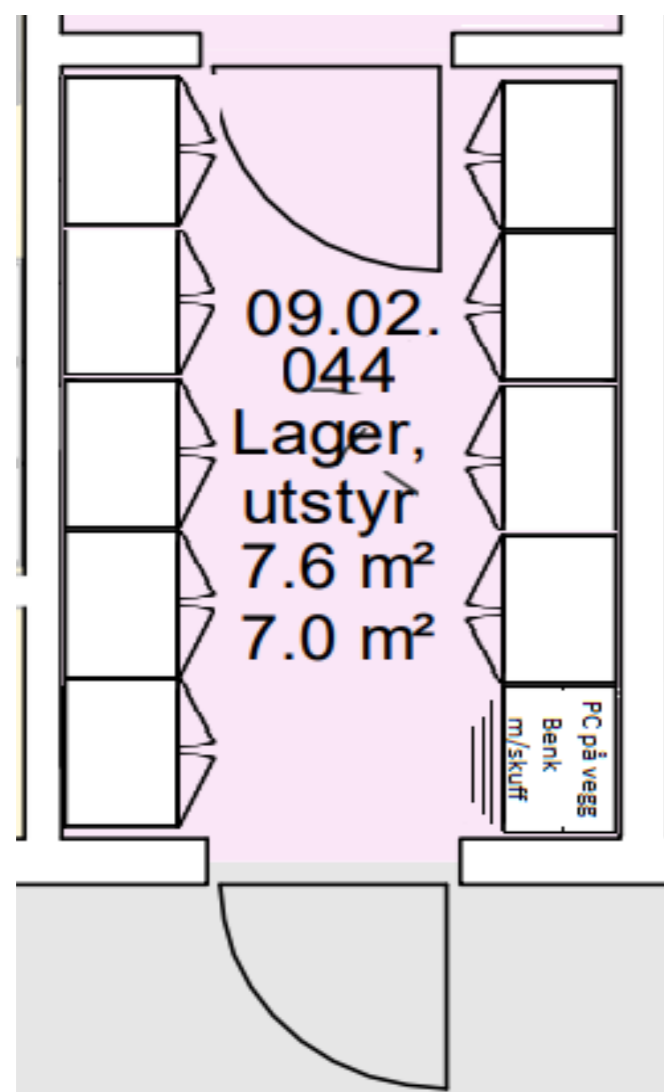

09.02.026 Manøverrom, 2 plasser

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | ARK | Gruppen bes vurdere størrelse på arbeidsbord i forhold til antall skjermer. 1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer. | |
| 2 | ARK | Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal oppbevares der? | |
| 3 | ARK | Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på manøverromn? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere tilbakemelding. | |

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | | 2 IARK | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | | 1 HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | | 4 IARK | |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | | 1 RIV | |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | | 1 RUT | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | | 2 IARK | |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | | 1 IKT | |
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | | 1 IKT | |
| FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | | 1 ARK | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | | 1 RUT | |

Kopi av utstyrsliste akter tilbakemelding PCI 27112023.xlsx (003 - Tilbakemelding fra gruppen på utstyrslister)

| 09.02.027 Manøverrom, 3 plasser | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS | |
| 1 | | | | |
| 2 | <p>1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer.</p> <p>Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal oppbevares der?</p> | ARK | | |
| 3 | | | | |
| 4 | <p>Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på manøverrom? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere tilbakemelding.</p> | ARK | | |



| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|---|--------|--------|---|
| 090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | | IKT Hva er denne skjermen til? |
| 011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | | RUT |
| 091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | | IKT |
| 037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | | RUT |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | | HF ? |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | | ARK Flyttes |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | | IARK |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | | IARK Fjerne, underskap i stedet |
| GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 3 | | IARK 2 stk og et på 1 meter som tegning |
| NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | | RIV |
| | Speil | 1 | | |
| | Underskap seksjon med 6-8 rom d=400 b=650 h=800 | 2 | | |
| | Overskap over underskap.d=350 b=650 h=650 | 4 | | |

Kopi av utstyrsliste akertilbakemelding PCI 27112023.xlsx (003 - Tilbakemelding fra gruppen på utstyrsliste)

09.02.008 Lager, rent

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen Fellesvarer for PCI og PM Må tegnes om, se forslag Også lagt ved tegning av desinfeksjonsrom | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|--------------------------|--|----------------------------|
|---|--------------------------|--|----------------------------|

| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| 091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | | IKT Fjernes |
| 061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | | RUT Mindre bord 100cm x 50/60 m |
| FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | | ARK Fjernes |
| FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | | ARK D=450 B=800 |
| FHB.001 | Hyllereli, hovedartikkel | 1 | | ARK Fjernes |
| FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | | ARK Fjernes |
| FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | | ARK Fjernes |
| | Pakke, PC radiograf standard | 1 | | |
| | Høyskap, kasse-bakke d=457 b=650 h=2100, doble glassdører | 15 | | |
| | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | | |
| | Overskap d=35 b=70 H=70 | 2 | | |
| | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | | |

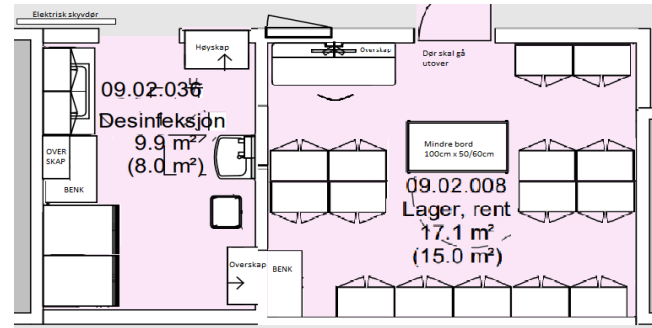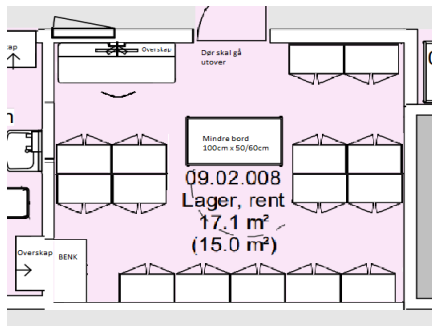


09.02.038 Arbeidsrom tverrfaglig/team stort

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet? | | | |


| Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|------------|---|--------|--------|---|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 6 | IARK | Bredde 120cm? 8 stk? |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK | Fjernes |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 6 | IARK | 8 stk? |
| 091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT | ? |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 6 | IKT | 8 stk? |
| 090.006 | Skjerm, vegghengt | 1 | IKT | ? |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 8 | IARK | |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 2 | IARK | Fjernes |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK | Fjernes |


Overskap med dører over alle pultene 35 cm dybde (hele veggen begge sider også inne på kontorene)
 Modul skillevegg for å dele av rommet i to
 2 seperater innganger
 Flytte dører
 2 dører med frostet glass inn til kontor
 2 dører med vindu fra korridor (evt gå utover?)
 2 stk 55 " skjermer for demonstrasjon

Til fagbøker, studiepermer ol

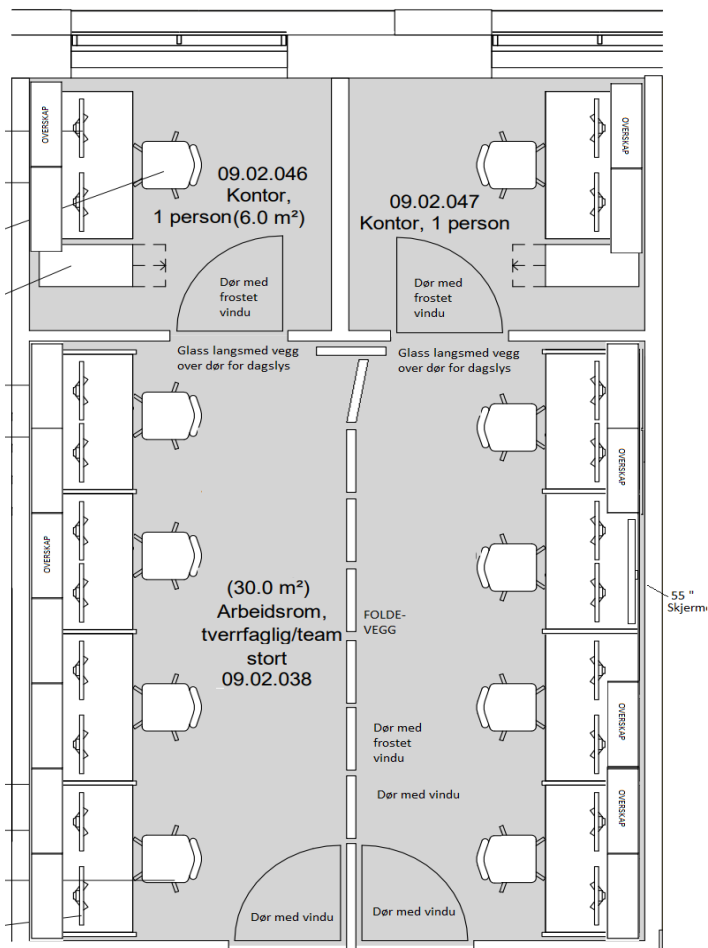

Dør i korridor.png (004 - Gnerelt)

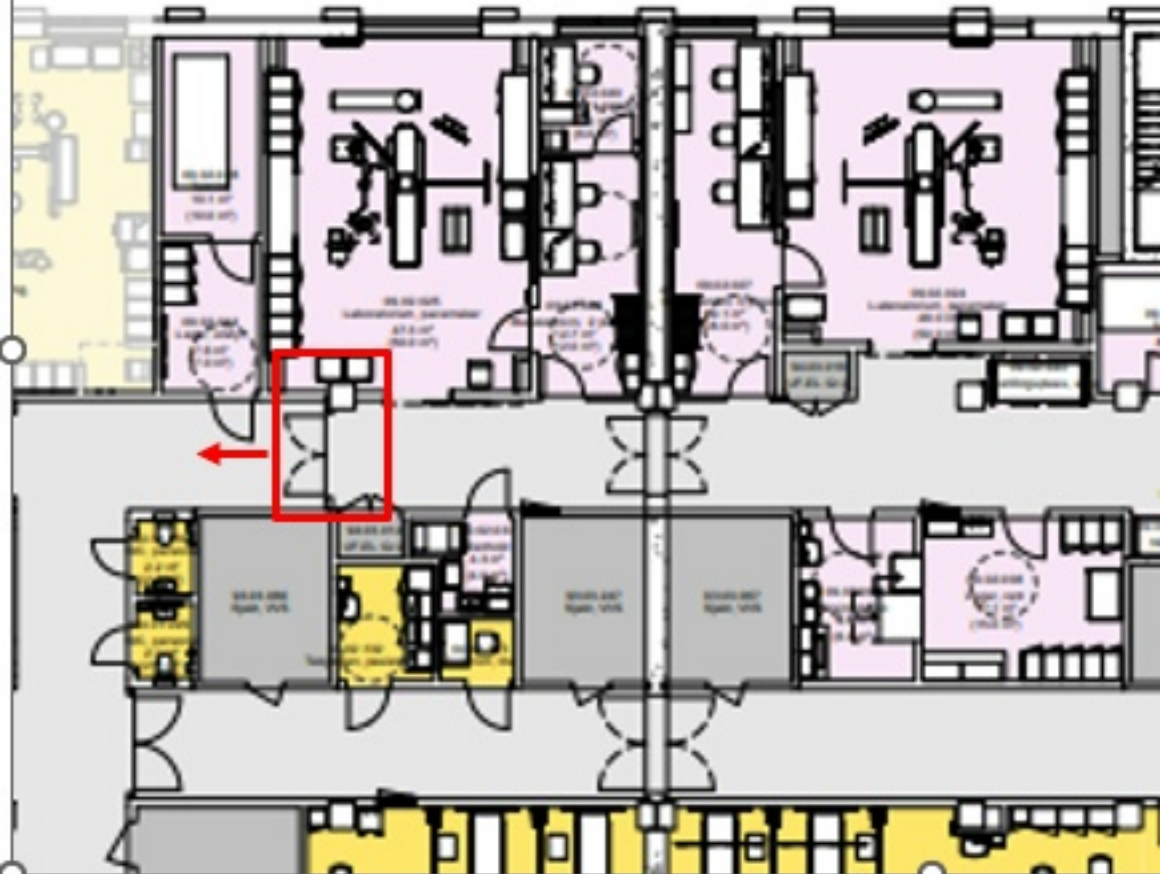

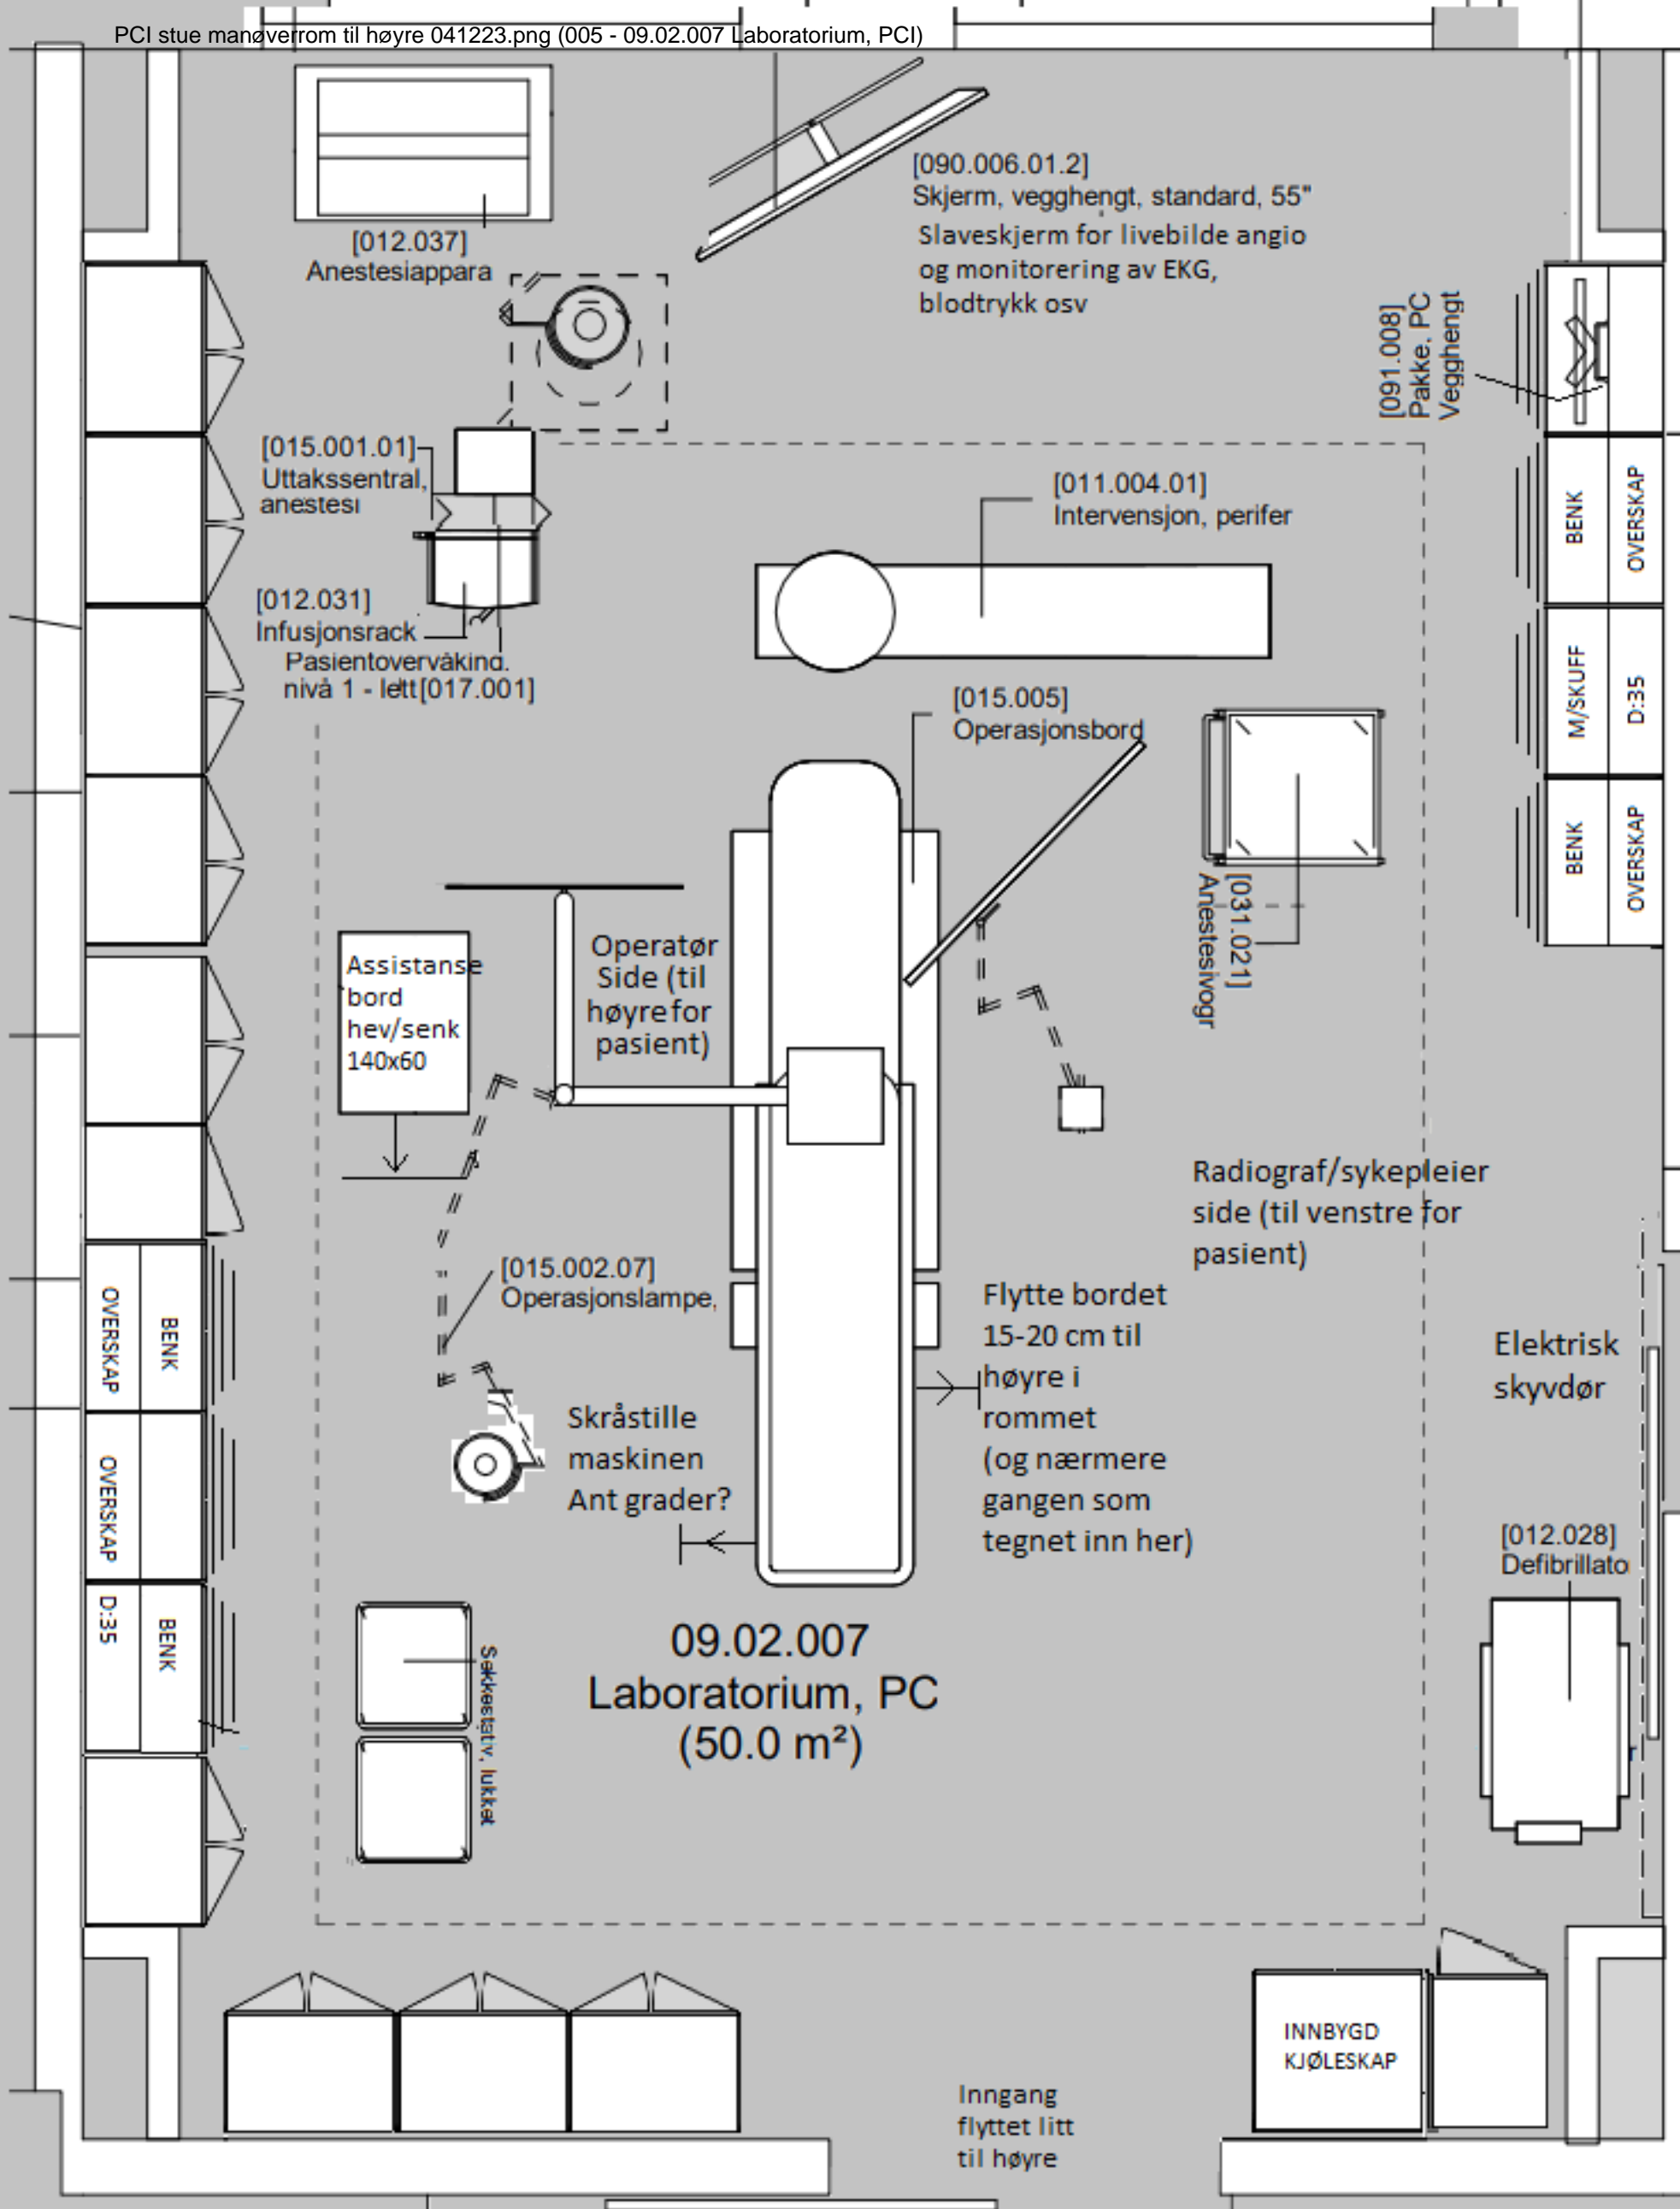

Flytte vindu inn mot sjalterom noen cm for å gjøre plass til vegghengt PC

Flyttet vindu inn mot sjalterom noen cm for å gjøre plass til 1 stk høyskap

